


<i>Tipo de informe</i>	<i>MISION</i>
<i>Programa</i>	<i>Infraestructuras</i>
<i>Nombre de Proyecto</i>	<i>"Mejoras a los dormitorios y a los baños higiénicos del Pabellón 2 y 4 del IPT La Pintada".</i>
<i>Fecha</i>	<i>09/12/2016</i>
<i>Hora de salida</i>	---
<i>Hora de regreso</i>	---
<i>Lugar</i>	<i>La Pintada, Sector El Hato</i>
<i>Coordenadas</i>	
<i>No. de part. MPSA</i>	<i>1</i>
<i>No. de part. Socios</i>	<i>1</i>
<i>No. de part. externos</i>	---
<i>Nombre de Part. MPSA</i>	<i>René Sánchez</i>
<i>Nombre de Part. Socios</i>	<i>Thania Herrera</i>
<i>Nombre de Part. Externos</i>	---
<i>Nombre de Organización Socios</i>	<i>Ingeniería y Mediciones S.A (INMESA)</i>
<i>Nombre de Organización Externos</i>	---
<i>Escrito por</i>	<i>René Sánchez</i>
<i>Objetivo de Misión</i>	<i>Seguimiento a la ejecución de los trabajos y evaluar avance de la obra.</i>
<i>Resultados</i>	<i>Dormitorio de Damas</i> <i>.Desmonte de lámparas de tubos fluorescente tipo canal,</i> <i>.Desmonte de cielo raso de láminas de plywood de 1/4" de espesor apoyadas en estructura de madera.</i> <i>.Instalación de cielo raso suspendido de láminas de 2' x 2' tipo Skyline en ángulos y tee de latón esmaltado color blanco.</i> <i>. Rehabilitación del sistema eléctrico</i> <i>. instalación de las luminarias 3 x 32 empotrable s/pantallas</i> <i>. Instalación de abanicos de techo KDK de 3 aspas de 56"</i> <i>. Reemplazo de baldosas de alto tráfico, con zócalos de 0.10 m</i> <i>. Pintura de acabado en las paredes interna del dormitorio.</i> <i>. Reemplazo de inodoros en área de los servicios higiénicos</i> <i>. Restablecimiento del sistema eléctrico en los servicios higiénicos, duchas y cuarto de supervisor</i> <i>. Reemplazo de puertas de madera de 1.50 x 0.70 m en cubículos de los inodoros</i> <i>. Pintura de acabado en paredes del área de duchas, servicios higiénicos y pasillo</i>

	<i>. Reemplazo de brazo, cabezales y llaves de duchas</i> <i>. Instalación de mallas anti mosquitos de fibra de vidrio revestida de P.V.C. con marco de aluminio de 35" x 47".</i> <i>. Instalación de mallas anti mosquitos de fibra de vidrio revestida de P.V.C. con marco de aluminio de 5.69 m x 0.60 m.</i> DORMITORIO DE VARONES <i>. Reemplazo y colocación de piezas de azulejos en orinal</i>
<i>Seguimiento</i>	<i>- Entrega formal del proyecto al Programa Mi Escuela Primero</i>

REGISTRO FOTOGRAFICO



ANTES

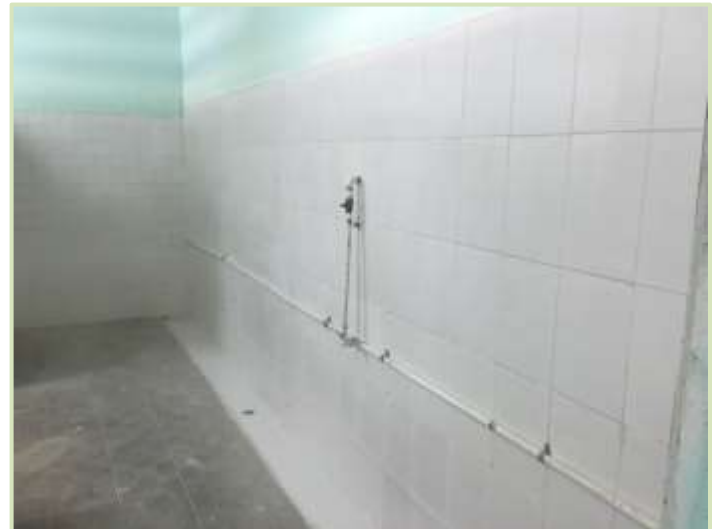

DESPUES
